



TESOURO NACIONAL

**PDSTI – Plano de Desenvolvimento
de Soluções de TI**

2017

CONTEÚDO

<u>INTRODUÇÃO</u>	<u>3</u>
<u>PORTFÓLIO DE PROJETOS FINALÍSTICOS</u>	<u>4</u>
<u>TERMO DE APROVAÇÃO</u>	<u>10</u>
<u>ANEXO I</u>	<u>11</u>

INTRODUÇÃO

Este documento tem fundamento no artigo 4º da Portaria STN nº 71, de 02/02/2017, e visa a submissão para apreciação, priorização e aprovação do Comitê de Gestão – COGES da lista dos projetos de Tecnologia da Informação a serem tratados pela COSIS no exercício de 2017. Nesse contexto, considera-se como projeto de TI todo aquele que objetiva o desenvolvimento ou a aquisição de novos sistemas, serviços ou recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, ou ainda evoluções naqueles já existentes.

Este plano foi elaborado em sintonia com a definição das metas finalísticas e corporativas definidas no Plano Estratégico Institucional da Secretaria do Tesouro Nacional – STN para o quadriênio de 2016-2020 e está alinhado ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2016-2017.

Esta versão é uma atualização do documento original, contemplando as alterações importantes ocorridas no primeiro semestre do exercício de 2017.

HISTÓRICO DE REVISÕES

A primeira revisão da lista aprovada no PDSTI-2017 contempla as seguintes alterações:


PROJETOS CONCLUÍDOS		
SUCOP	COSIS	SIAFI-INTEGRA
SURIN	COINT	NOVO-CAUC
SUPOF	COFIN	DARF Numerado – Fase 1- SPB

PROJETOS EXCLUÍDOS DA LISTA			
SURIN	CORFI	NOVO PAINEL FEDERATIVO	O projeto foi reformulado e evoluiu para o projeto Mapa de Operações de crédito, que foi concluído em 30/06/2017.
SURIN	COREM	SIGOR	O escopo do projeto foi absorvido no Projeto SICONFI-PAF.
SUDIP	COGEP	NOVA PLATAFORMA DO TESOIRO DIRETO	O projeto foi suspenso a pedido da área de negócio.
SUPOF	COFIS	SISEC – SISTEMA DE SECURITIZAÇÃO	O projeto deixou de ser estratégico e está sendo executado como um projeto não-estratégico.
SUPOF	COFIN	DARF Numerado	O escopo do Projeto DARF Numerado foi subdividido em dois projetos: Fase 1 - SPB e Fase 2 -INTRA-SIAFI.
SUCOP	COSIS	SICONFI-INTEGRA	O Projeto foi substituído pelo SICONFI-PAF que contemplará as funcionalidades do PAF e a conclusão da Matriz de Saldos Contábeis - MSC.

PROJETOS INCLUÍDOS NA LISTA		
SUCOP	COSIS	SICONFI-PAF
SUPEF	CESEF	PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICAS FISCAIS HARMONIZADAS
SUPEF	CESEF	EVOLUÇÃO DO NOVO SÉRIES TEMPORAIS
SUDIP	COGEP	APLICATIVO IOS DO TESOIRO DIRETO
SUPOF	COFIN	DARF Numerado – Fase 2 - INTRA SIAFI

PORTFÓLIO DE PROJETOS FINALÍSTICOS – LISTA ATUALIZADA

A lista contempla os projetos estratégicos, identificados junto às áreas de negócio da STN após a primeira revisão anual, que serão tratados no exercício de 2017.

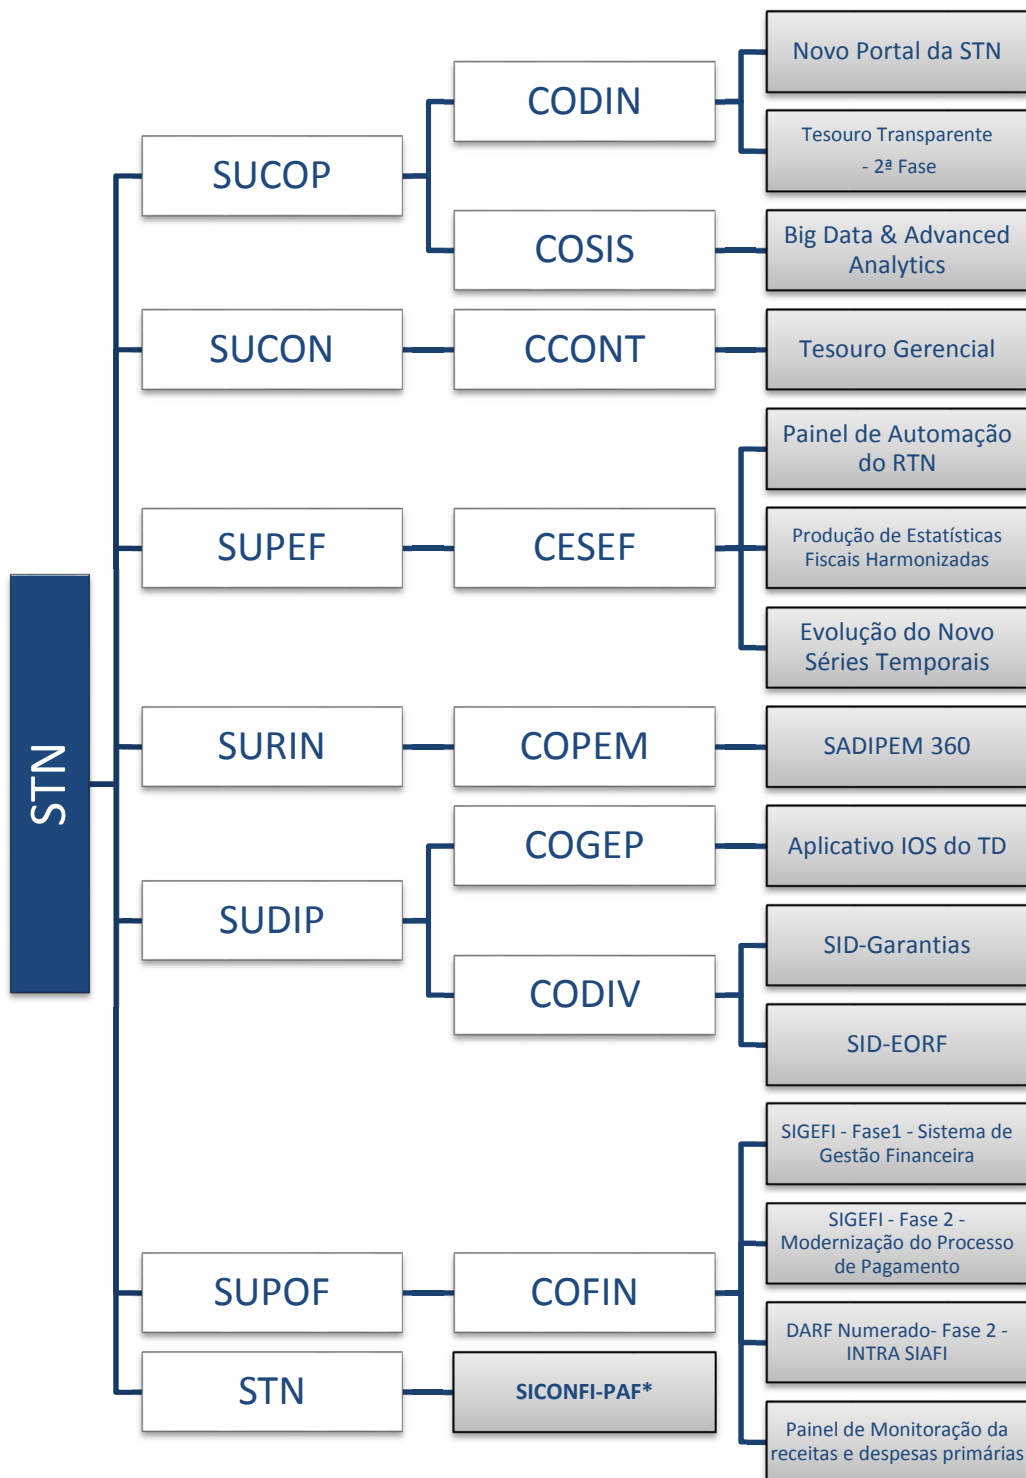

**Projeto executado em conjunto com duas Subsecretarias: SUCON (CCONF) e SURIN (CORFI).*

O Planejamento Estratégico tem a função precípua de estabelecer o direcionamento da instituição, promovendo, para isso, o alinhamento dos recursos e esforços da organização. Dessa forma, é importante demonstrar a convergência das ações de Tecnologia da Informação para com os Objetivos Estratégicos da STN, conforme tabela a seguir.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DIRECIONADORES DE TECNOLOGIA	PROJETOS ESTRATÉGICOS	CUSTO ESTIMADO TOTAL	CUSTO ESTIMADO DESENV. EM 2017	PRAZO ESTIMADO	
PEI-OE1: Aperfeiçoar o processo de planejamento fiscal de curto, médio e longo prazos	Ampliar a Capacidade Analítica das Áreas de Negócio	SIGEFI – Fase 1 - Sistema de Gestão Financeira	R\$ 1.591.558,78	R\$ 795.779,39	02/07/2018	
PEI-OE3: Aperfeiçoar o processo de programação orçamentária e financeira		SIGEFI – Fase 2 - Modernização do Processo de Pagamento	*	*	*	
		Painel de automação do RTN	**	**	*	
		Painel de Monitoração de receitas e despesas primárias	**	**	30/06/2017	
PEI-OE4: Avaliar e mitigar os riscos fiscais e regulatórios dos ativos e passivos no TN			Tesouro Gerencial	R\$ 35.165.329,77	R\$ 2.886.054,16	31/07/2017
PEI-OE7: Contribuir para a sustentabilidade fiscal de Estados e Municípios			SID - Módulo de Execução Orçamentária e Financeira	R\$ 5.268.542,36	R\$ 1.126.195,84	28/12/2018
			Big Data & Advanced Analytics	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	30/06/2017
PEI-OE5: Disponibilizar informações e implantar a governança da informação	Aprimorar os mecanismos de transparência	Tesouro Transparente - Segunda Fase	R\$ 972.548,22	R\$ 548.097,30	29/12/2017	
EGD-OE1: Fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos		Evolução do Novo Séries Temporais	**	**	*	
EGD-OE2: Ampliar uso de TICs para transparência e publicidade à aplicação dos recursos		Produção de Estatísticas Fiscais Harmonizadas	**	**	08/09/2017	
PEI-OE2: Implantar políticas integradas de investimento, financiamento e garantias	Ampliar as integrações entre sistemas e informações	SID - Garantias	R\$ 627.619,51	R\$ 422.323,44	24/11/2017	
PEI-OE10: Promover a transversalidade dos processos e informações		SICONFI-PAF	R\$ 2.219.612,96	R\$ 1.109.806,48	*	
PEI-OE12: Implantar modelo de Gestão Integrada		SADIPEM 360	R\$ 6.135.780,96	R\$ 2.045.260,32	23/09/2019	
EGD-OE6: Facilitar e universalizar o uso e acesso aos serviços digitais						

EGD-OE7: Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura		DARF Numerado – Fase 2 – INTRA SIAFI	R\$ 940.549,92	470.274,96	30/06/2018
PEI-OE8: Aprimorar os canais e formas de comunicação	Aprimorar os canais e formas de comunicação	Novo Portal da STN	R\$ 287.180,04	R\$ 143.590,02	31/03/2018
EGD-OE9: Ampliar e incentivar a participação social na criação e melhoria dos serviços públicos		Aplicativo iOS do Tesouro Direto	R\$ 803.298,29	R\$ 803.298,29	01/11/2017
EGD-OE10: Aprimorar interação direta entre governo e sociedade					

* Custo e Prazo serão definidos após a definição de escopo do projeto junto à área de negócios.

** Projeto sem impacto orçamentário direto.

Além da convergência das ações de Tecnologia da Informação para com os Objetivos Estratégicos da STN, as tabelas abaixo demonstram a convergência destes projetos com os projetos estratégicos elencados no PEI – Planejamento Estratégico da Instituição.

PROJETOS		PATROCINADOR	PROJETO PDSTI	CUSTO ESTIMADO TOTAL	CUSTO ESTIMADO DESENV. EM 2017	PRAZO ESTIMADO
STN201619	Promover a integração de informações fiscais e contábeis de Estados e Municípios	SUCON	SICONFI-PAF	R\$ 2.219.612,96	R\$ 1.109.806,48	*
PEC201608						
STN201625	Implantação de metodologia de mensuração de custos das Unidades Administrativas	SUCON	TESOURO GERENCIAL	R\$ 35.165.329,77	R\$ 2.886.054,16	31/07/2017
PEC201607						
STN201633	Segunda fase do Projeto Tesouro Transparente	SUCOP	TESOURO TRANSPARENTE -2ª FASE	R\$ 972.548,22	R\$ 548.097,30	29/12/2017
PEC201602						
PEC201206	Aperfeiçoamento do Sistema Integrado da Dívida Pública - SID	SUDIP	SID-EORF	R\$ 5.268.542,36	R\$ 1.126.195,84	28/12/2018
			SID-GARANTIAS	R\$ 627.619,51	R\$ 422.323,44	24/11/2017
PEC201605	Revisão do sistema de Garantias e de Procedimento de Endividamento dos Estados (Fortalecimento Institucional Fiscal)	SURIN	SADIPEM 360 SID-GARANTIAS	R\$ 6.135.780,96	R\$ 2.045.260,32	23/09/2019
				R\$ 627.619,51	R\$ 422.323,44	24/11/2017

	PROJETOS	PROJETO PDSTI	CUSTO ESTIMADO TOTAL	CUSTO EST. DESENV. EM 2017	PRAZO ESTIMADO
CCONF_6_1*	Implantação da MSC na Federação com disponibilização de mecanismo de consulta	SICONFI-PAF	R\$ 2.219.612,96	R\$ 1.109.806,48	*
COINC_1_1*	Implantar o Modelo Padronizado de Mensuração de Custos das Unidades Administrativas, permitindo a comparabilidade das despesas discricionárias.	TESOURO GERENCIAL	R\$ 35.165.329,77	R\$ 2.886.054,16	31/07/2017
CODIN_2_1	Tesouro Transparente	Tesouro Transparente - 2ª Fase	R\$ 972.548,22	R\$ 548.097,30	29/12/2017
CODIN_3_1	Gestão do Desempenho				
COSIS_2_1	Big Data & Advanced Analytics	Big Data & Advanced Analytics	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	30/07/2017
CESEF_1_5	Elaborar análise nas áreas de saúde e educação com diagnósticos de políticas públicas e projeções da trajetória das despesas destas pastas do governo federal para o período 2017 - 2027	Big Data & Advanced Analytics			
COFIN_1_1	Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão Financeira - SIGEF	SIGEFI - Sistema de Gestão Financeira	R\$ 1.591.558,78	R\$ 795.779,39	02/07/2018
		SIGEFI - Modernização do Processo de Pagamento	*	*	*
CORFI_1_2	Desenvolvimento do Portal dos Governos Regionais	SICONFI-PAF	R\$ 2.219.612,96	R\$ 1.109.806,48	*
		Tesouro Transparente - 2ª Fase	R\$ 972.548,22	R\$ 548.097,30	29/12/2017
CORFI_2_1	Aprimorar o processo de acompanhamento do limite de garantias da União	SID GARANTIAS			
CORFI_3_1	Sistema Integrado dos Governos Regionais	SICONFI-PAF	R\$ 2.219.612,96	R\$ 1.109.806,48	*
CODIV_1_1*	Coordenar e implementar funcionalidades no Projeto SID- 2017	SID-EORF	R\$ 5.268.542,36	R\$ 1.126.195,84	28/12/2018
CODIV_1_2*		SID-Garantias	R\$ 627.619,51	R\$ 422.323,44	24/11/2017
COGEP_3_1*	Desenvolver ações de melhoria do Tesouro Direto	Aplicativo iOS do Tesouro Direto	R\$ 803.298,29	R\$ 803.298,29	01/11/2017
COGEP_3_2*					
COGEP_3_3*					
COGEP_3_4*					
COGEP_3_5*					

DELIBERAÇÃO DO VOTO

Considerando as disponibilidades orçamentárias para o exercício de 2017, além dos custos estimados dos projetos estratégicos, propõe-se a execução priorizada dos projetos supracitados. Destaca-se que essa proposição, ao longo do exercício, poderá sofrer alterações de forma a manter o alinhamento necessário em relação aos limites orçamentários disponíveis e à estratégia da Secretaria do Tesouro Nacional.

TERMO DE APROVAÇÃO

A Secretaria Executiva do Comitê de Gestão – COGES encaminha para aprovação o Plano de Desenvolvimento de Soluções de TI - PDSTI da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a cargo da Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação – COSIS, referente ao exercício de 2017.

Brasília/DF, de agosto de 2017.

LINCOLN MOREIRA JORGE JUNIOR
Coordenador-Geral de Sistemas e Tecnologia
de Informação

VINÍCIUS MENDONÇA NEIVA
Coordenador-Geral de Desenvolvimento
Institucional

O COGES, no uso da competência que lhe confere seu Regimento Interno, considera aprovado o PDSTI da STN referente ao exercício de 2017, determinando à COSIS que tome as medidas necessárias e suficientes para a adequada execução dos projetos em pauta.

LÍSCIO FÁBIO DE BRASIL CAMARGO
Subsecretário de Assuntos Corporativos

OTÁVIO LADEIRA DE MEDEIROS
Secretário Adjunto do Tesouro Nacional

ADRIANO PEREIRA DE PAULA
Subsecretário de Política Fiscal

JOSÉ FRANCO MEDEIROS DE MORAIS
Subsecretário da Dívida Pública

PRICILLA MARIA SANTANA
Subsecretária de Relações Financeiras
Intergovernamentais

PEDRO JUCÁ MACIEL
Subsecretário de Planejamento e Estatísticas
Fiscais

GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM
Subsecretária de Contabilidade Pública

CLAUDENIR BRITO PEREIRA
Diretor de Riscos, Controle e Conformidade

ANDRÉ DE ARAÚJO MELO
Representante dos servidores

ANEXO I

A seguir, são apresentados os resumos descritivos de cada um dos projetos estratégicos que serão tratados em 2017:

Novo Portal da STN			
Área:	Responsável na Área:	Sistema:	Intervenção:
SUCOP/CODIN	Pedro Turbay	PORTAL INTERNET STN	Desenvolvimento
Estimativa de custo: R\$ 287.180,04		Status: não iniciado	
Reformulação do sítio de internet do Tesouro Nacional, de acordo com o novo padrão de Identidade Digital do Governo da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Inclui uma nova arquitetura de informação e navegação, de acordo com nossa taxonomia e catálogo de informações. Envolve também migração de conteúdo de consultas e relatórios para o Tesouro Transparente.			

Painel de Automação do RTN			
Área:	Responsável na Área:	Sistema:	Intervenção:
SUPEF/CESEF	Felipe Palmeira Bardella	Painel RTN	Desenvolvimento
Estimativa de custo: sem impacto orçamentário		Status: não iniciado	
Aprimoramento de: camada de dados, consolidação das diversas fontes de dados, inclusive, com automatizações nos mecanismos de coletas; camada de aplicação, automatizações no processo de extração, transformação e carga dos dados, conforme regras de negócio, ainda que parcialmente; camada de apresentação, propositura de painel gerencial, com possibilidades de uso interno, pelos gestores da área, e também externo, por meio de publicações no Portal TT.			

SICONFI - PAF

Área: SUCON/CCONF SURIN/CORFI	Responsável na Área: Leandro Moreira Souto	Sistema: SICONFI	Intervenção: Evolutiva
Estimativa de custo: R\$ 2.219.612,96		Status: não iniciado	
<p>O objetivo do projeto é evoluir o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi com relação à Matriz de Saldos Contábeis e criar um mecanismo de operacionalização do Programa de Ajuste Fiscal – PAF – e suas especificidades, tais como: projeções, definição de metas e compromissos, acompanhamento do PAF, além do compartilhamento dessas informações com outras áreas e sistemas da STN. Com um único mecanismo de acesso no Siconfi, o ente da Federação poderá enviar as suas declarações em atendimento à LRF e também operacionalizar, acompanhar e prestar contas do PAF.</p>			

SID - Garantias

Área: SUDIP/CODIV	Responsável na Área: Daniel Klug Nogueira	Sistema: SID	Intervenção: Evolutiva
Estimativa de custo: R\$ 627.619,51		Status: em execução	
<p>Evolução do atual Módulo Contratual e Análise da Dívida do SID. Esta evolução visa a unificação do controle das garantias internas, externas e fundos em um único sistema de grande porte, o qual já comporta atualmente toda a dívida pública da União. Com essa unificação, será possível prestar informações para as diversas áreas do Tesouro, órgãos de controle e público externo com uma maior qualidade e tempestividade. Além disso a unificação no SID irá superar os atuais problemas de cálculos existentes nos sistemas atuais, bem como diminuirá o risco operacional na medida em que o manuseio de dados passará a ser mínimo e concentrado apenas em um único sistema.</p>			

SID – Módulo de Execução Orçamentária e Financeira

Área: SUDIP/CODIV	Responsável na Área: Leonardo Martins Canuto Rocha	Sistema: SID	Intervenção: Evolutiva
Estimativa de custo: R\$ 5.268.542,36		Status: em execução	
<p>O objetivo do projeto é criar solução que viabilize o controle, o registro e a contabilização da execução orçamentária, financeira e contábil da dívida pública federal sob responsabilidade do</p>			

Secretaria do Tesouro Nacional, centralizando as informações e apoiando o processo de tomada de decisão.

SIGEFI – Fase 1 - Sistema de Gestão Financeira

Área: SUPOF/COFIN	Responsável na Área: Marcelo Pereira de Amorim	Sistema: SIGEFI	Intervenção: Desenvolvimento
-----------------------------	--	---------------------------	--

Estimativa de custo: R\$ 1.591.558,78

Status: em execução

O Sistema de Gestão Financeira, SIGEFI, promoverá a automação dos processos da COFIN através da sistematização das informações usualmente apuradas, por meio de um sistema robusto, confiável, possibilitando maior fidedignidade das informações, tempestividade e melhor eficácia no levantamento de subsídios favoráveis à tomada de decisões, além da melhoria do processo de acompanhamento da gestão orçamentária e financeira.

Os principais objetivos do projeto são:

- Automação da programação orçamentária e financeira;
- Otimização do processo de geração do acompanhamento diário da execução financeira (ACOMP)
- Automação e integração com o SIAFI: execução da programação financeira
- Registro histórico de previsões e realizações de receitas e despesas;
- Implementação de controle da alçada com certificação digital;
- Informações gerenciais tempestivas para subsídios de decisões;
- Simulação de cenários

SIGEFI – Fase 2 - Modernização do Processo de Pagamento

Área: SUPOF/COFIN	Responsável na Área: Marcelo Pereira de Amorim	Sistema: SIAFI Operacional	Intervenção: Evolutiva
-----------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------

Estimativa de custo: *

Status: não iniciado

A modernização do processo de pagamento visa corrigir diferenças entre os saldos da Conta Única no SIAFI e no BACEN na medida em que o saque à Conta Única ocorrerá no mesmo dia da emissão da ordem bancária no SIAFI. A medida contribui para melhoria na gestão de caixa, indo ao encontro do registro fidedigno e tempestivo dos desembolsos realizados, solucionando, ainda, questionamento

dos órgãos de controle quanto à existência de lapso temporal entre a despesa realizada no SIAFI e seu respectivo saque na Conta Única.

A dinamização desses pagamentos também será favorecida pela implementação de ferramenta móvel que possibilite aos gestores e aos ordenadores procederem autorização eletrônica, ainda que ausentes fisicamente de suas unidades.

**A estimativa de custo do projeto somente será feita após o término da Análise de Negócios da demanda.*

Tesouro Gerencial

Área: SUCON/CCONT	Responsável na Área: Tiago Maranhão Barreto Pereira	Sistema: TG	Intervenção: Desenvolvimento
Estimativa de custo: R\$ 35.165.329,77		Status: em execução	
<p>O Tesouro Gerencial é um sistema de consulta de informações, a partir de dados do SIAFI, construído na plataforma de business intelligence Microstrategy (a mesma utilizada no Sistema de Informações de Custos), que a partir de 2015 consolidará as informações do SIAFI Gerencial e das soluções de data warehouse (DW) da STN numa base de dados única, com cinco temas: Consultas Gerenciais; Pagamento Efetivo; Custos; LRF; GFSM.</p> <p>Seus benefícios em relação às atuais soluções são: a ampliação expressiva da abrangência e a atomicidade dos dados (praticamente todos os dados do SIAFI, no mesmo nível de detalhe), a geração de relatórios dinâmicos (com funcionalidades como pivotagem, drill e filtros de exibição), a modularidade, a construção de documentos complexos e painéis (dashboards) e o agendamento de consultas.</p>			

Tesouro Transparente - Segunda Fase

Área: SUCOP/CODIN	Responsável na Área: Dênis de Queiroz Braz	Sistema: TT	Intervenção: Evolutiva
Estimativa de custo: R\$ 1.000.000,00		Status: em execução	
<p>Criação de um painel analítico que consolida dados do fluxo de programação financeira como um todo, sob diferentes perspectivas, apontadas pelo Subsecretário, como Programas Sociais, Previdência, Subsídios e Subvenções, Dividendos e Participações Societárias, Órgãos, entre outras.</p>			

Big Data & Advanced Analytics			
Área: SUCOP/COSIS	Responsável na Área: Lincoln Moreira Jorge Junior	Sistema: Não se aplica	Intervenção: Desenvolvimento
Estimativa de custo: R\$ 200.000,00		Status: em execução	
<p>O objetivo do projeto é definir uma plataforma tecnológica capaz de proporcionar maior correlação entre dados e processos da STN, com a identificação de padrões tácitos, por meio do emprego de algoritmos avançados no processamento e análise de bases diversas, tais como SIAFI, SICONFI, FINBRA, RTN, IBGE, FIRJAN etc. O projeto visa ainda a introdução do papel de Cientista de Dados na STN. Tal se caracteriza, basicamente, pelo emprego multidisciplinar de técnicas e ferramentas avançadas visando a descoberta de informações relevantes, as quais, por vias convencionais de análise, fortalecendo-se o processo decisório na instituição. Os dois conceitos que se destacam nessa temática são Big Data e Advanced Analytics. O primeiro contempla uma gama de tecnologias capazes de lidar melhor com volumes de dados não adequadamente processados em bancos de dados convencionais. Já o segundo trata das análises de dados que utilizam sofisticadas técnicas para descoberta, tais como a Mineração de Dados e a Aprendizagem de Máquina, indo muito além das abordagens tradicionais.</p>			

SADIPEM 360			
Área: SURIN/COPEM	Responsável na Área: Florian Immanuel Schumacher	Sistema: SADIPEM	Intervenção: Evolutiva
Estimativa de custo: R\$ 6.135.780,96		Status: em execução	
<p>O projeto conterà as seguintes releases: ajuste CDP exercício 2017, integrações com outros sistemas, análise em dois estágios, mensagens eletrônicas, reestruturação da COPEM, aditivos contratuais.</p> <p>O ajuste CDP exercício 2017 realizará os ajustes necessário nas contas que sofrerão alterações conforme Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) - 7ª edição: todo o quadro da dívida consolidada precisa ser reformulado e estar disponível no dia 02/01/2018, quando estarão valendo as novas regras (CDP 2017).</p> <p>As integrações com outros sistemas (SIGOR, SICONFI, CAUC, SID, etc) serão realizadas para atender o backlog de outros projetos, melhorar a qualidade dos dados e melhoria dos processo de trabalho.</p>			

A Análise em dois estágios trata-se da inclusão de uma etapa de análise de elegibilidade que será prévia à análise do PVL. Esse módulo simplificará a análise das operações com garantia da União, de maneira que pleitos que não atendam os requisitos mínimos seja arquivados/indeferidos antes de que seja aberto um processo na STN. Envolverá o cálculo da CAPAG, custo da operação e contragarantias.

As mensagens eletrônicas substituirão os ofícios e aumentarão sensivelmente a eficiência na comunicação com entes da Federação e instituições financeiras.

A reestruturação da COPEM visa atender a nova estrutura regimental da COPEM e permitir que o SADIPEM continue atendendo os processos de negócio da Coordenação.

Os aditivos contratuais referem-se ao recebimento de informações e análise que ainda são manuais, o que contraria a Portaria STN nº 9/2017, que prevê o envio de apenas documentos eletrônicos pelo SADIPEM.

**A estimativa de custo do projeto somente será feita após o término da Análise de Negócios da demanda.*

Aplicativo iOS do Tesouro Direto

Área: SUDIP/COGEP	Responsável na Área: Eric Lisboa Coda Dias	Sistema: TESOURO DIRETO	Intervenção: Evolutiva
Estimativa de custo: R\$ 803.298,29		Status: em execução	
O objetivo do projeto é desenvolver um aplicativo mobile oficial do Tesouro Direto para a plataforma iOS, pois há aplicativo oficial apenas para o Android.			

DARF Numerado – Fase 2 - INTRA-SIAFI

Área: SUPOF/COFIN	Responsável na Área: Ana Carolina Viana Peixoto	Sistema: SIAFI	Intervenção: Desenvolvimento
Estimativa de custo: R\$ 940.549,92		Status: não iniciado	
A Instrução Normativa SRF nº 96, de 27 de novembro de 2001, dispõe sobre o pagamento de receitas federais por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) impresso com código de barras.			
Atualmente, o código de barras do Darf contém os dados da arrecadação impressos no documento.			

Em 2007, a Receita Federal adotou um novo modelo de código de barras no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), em que somente o número do documento é expresso no código de barras.

Este modelo de código de barras do DAS passa, agora, a ser utilizado também no Darf.

O Siafi permite ao gestor do Governo Federal realizar a emissão do documento DARF no sistema, sem a necessidade de procurar a rede bancária para efetuar o pagamento. Diante disso, o Novo Siafi e Siafi deverão ser adaptados para contemplar o novo modelo de DARF numerado de forma a que não seja necessário que as Unidades Gestoras tenham que utilizar uma instituição pertencente à rede arrecadadora da RFB para fins de pagamento de um DARF com código de barras.

Produção de Estatísticas Fiscais Harmonizadas

Área: SUPEF/CESEF	Responsável na Área: Fernando Almeida Barbalho	Sistema:	Intervenção: Desenvolvimento
Estimativa de custo: sem impacto orçamentário		Status: em execução	
Criar um Datawarehouse para a CESEF no Oracle, com dados de diversas fontes, entre elas: SICONFI, AUDESP, FINBRA e SIMEM, de maneira a permitir que a área não se preocupe com o processo de extração e carga dos dados, que passará a ser feito de forma automatizada e monitorada pela COSIS.			

Evolução do Novo Séries Temporais

Área: SUPEF/CESEF	Responsável na Área: Fernando Almeida Barbalho	Sistema: SÉRIES TEMPORAIS	Intervenção: Evolutiva
Estimativa de custo: sem impacto orçamentário		Status: não iniciado	
O objetivo do projeto é evoluir o sistema Novo Séries Temporais, de forma que as funcionalidades que existiam no antigo sistema Séries Temporais sejam incorporadas, bem como adaptar as telas de visualização das séries para o layout do Tesouro Transparente.			

Painel de Monitoração de receitas e despesas primárias

Área: SUPOF/COFIN	Responsável na Área: Márcio Leão Coelho	Sistema:	Intervenção: Desenvolvimento
Estimativa de custo: sem impacto orçamentário		Status: não iniciado	
Painel de acompanhamento das receitas e despesas primárias do governo central com vistas ao cumprimento das metas estabelecidas pela LDO para o exercício.			
